Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ Информатика и системы управления

КАФЕДРА Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии

ОТЧЕТ ПО РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ 1
по курсу «Экономика программной инженерии»

Студент Пермякова Екатерина Дмитриевна

Группа ИУ7 – 82Б

Преподаватель Барышникова Марина Юрьевна

2026 г.

Содержание проекта:

Команда разработчиков из 7 человек. Проект должен быть завершен в течение 3 месяцев. Бюджет проекта: 675 000 рублей.

Задание1: Настройка рабочей среды

Дата начала проекта – 1й пн 2го квартала текущего года – 6 апреля

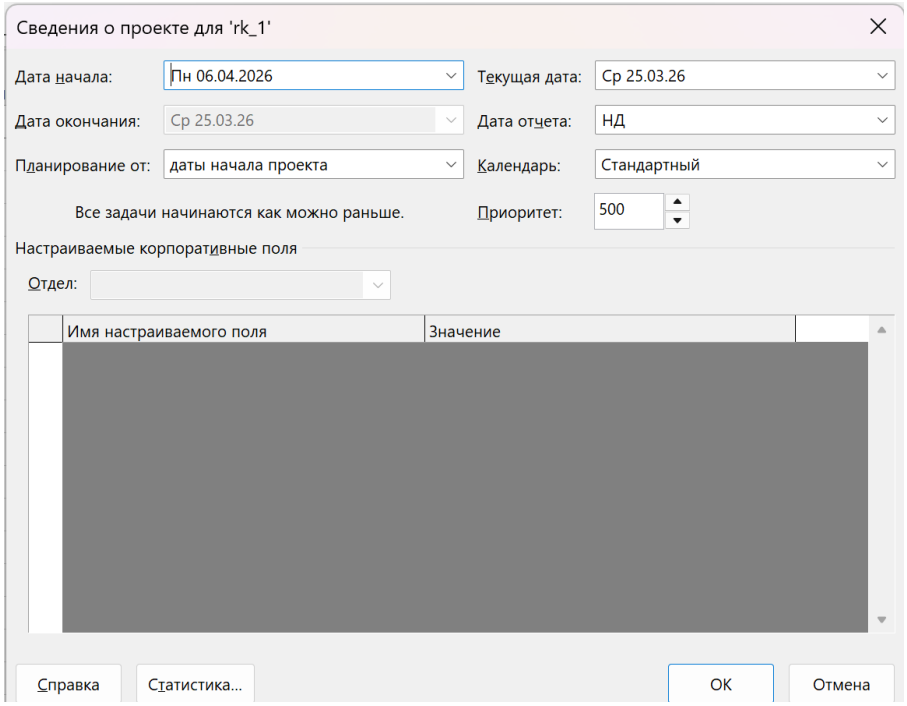

Установила тип работ с фиксированными трудозатрамами

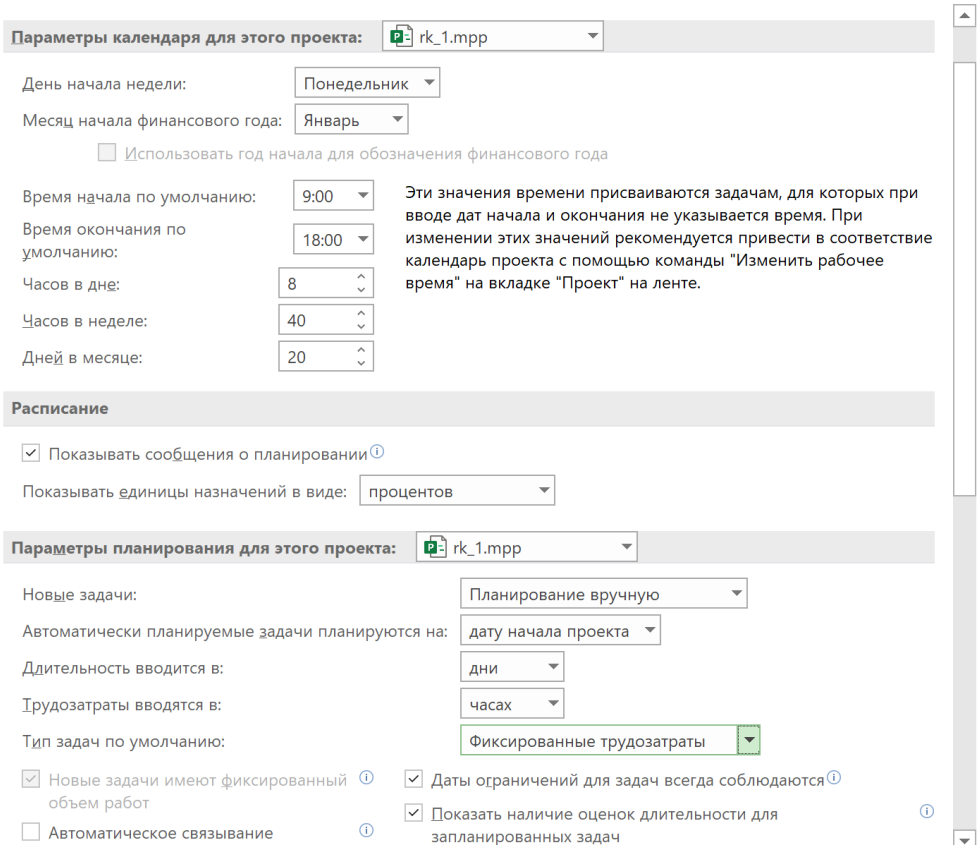

Установила праздничные и пред праздничные дни

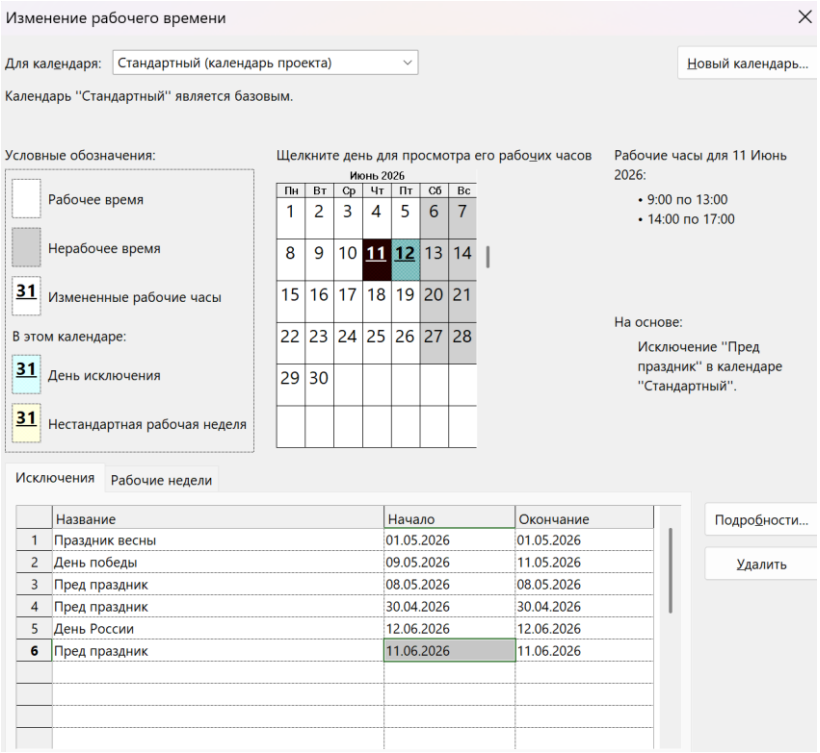

	Название	Начало	Окончание
1	Праздник весны	01.05.2026	01.05.2026
2	День победы	09.05.2026	11.05.2026
3	Пред праздник	08.05.2026	08.05.2026
4	Пред праздник	30.04.2026	30.04.2026
5	День России	12.06.2026	12.06.2026
6	Пред праздник	11.06.2026	11.06.2026

Задание 2: Создание списка задач

Режи задач	Название задачи	Длительнос	Начало	Окончание	Предшественник
	rk_1	**20 дней**	**Пн 06.04.26**	**Вт 05.05.26**	
	Начало проекта	0 дней	Пн 06.04.26	Пн 06.04.26	
	Установка ПО	15 дней	Пн 06.04.26	Пт 24.04.26	
	Обучение персонала	20 дней	Пн 06.04.26	Вт 05.05.26	
	Разработка представительских сайтов	1 день	Пн 06.04.26	Пн 06.04.26	
	Разработка сайта 1	5 дней	Пн 06.04.26	Пт 10.04.26	
	Разработка сайта 2	5 дней	Пн 06.04.26	Пт 10.04.26	
	Представительские сайты созданы	0 дней	Пн 06.04.26	Пн 06.04.26	
	Разработка корпоратичного сайта	1 день	Пн 06.04.26	Пн 06.04.26	
	Проектирование сайта	5 дней	Пн 06.04.26	Пт 10.04.26	
	Программирование сайта	15 дней	Пн 06.04.26	Пт 24.04.26	
	Наполнение сайта	3 дней	Пн 06.04.26	Ср 08.04.26	
	Тестирование сайта	5 дней	Пн 06.04.26	Пт 10.04.26	
	Сдача сайта заказчику	0 дней	Пн 06.04.26	Пн 06.04.26	

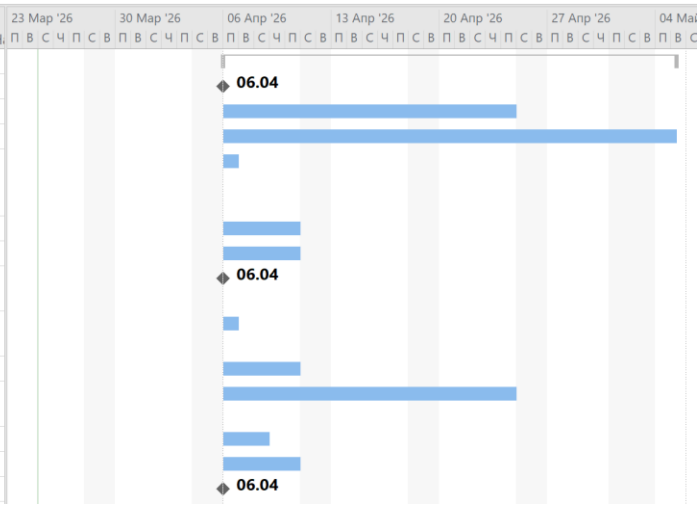

Задание 3: Структурирование списка задач

Режи задач	Название задачи	Длительнос	Начало	Окончание	Предшественник
	rk_1	**20 дней**	**Пн 06.04.26**	**Вт 05.05.26**	
	Начало проекта	0 дней	Пн 06.04.26	Пн 06.04.26	
	Установка ПО	15 дней	Пн 06.04.26	Пт 24.04.26	
	Обучение персонала	20 дней	Пн 06.04.26	Вт 05.05.26	
	Разработка представительских сайтов	**5 дней**	**Пн 06.04.26**	**Пт 10.04.26**	
	Разработка сайта 1	5 дней	Пн 06.04.26	Пт 10.04.26	
	Разработка сайта 2	5 дней	Пн 06.04.26	Пт 10.04.26	
	Представительские сайты созданы	0 дней	Пн 06.04.26	Пн 06.04.26	
	Разработка корпоратичного сайта	**15 дней**	**Пн 06.04.26**	**Пт 24.04.26**	
	Проектирование сайт	5 дней	Пн 06.04.26	Пт 10.04.26	
	Программирование сайта	15 дней	Пн 06.04.26	Пт 24.04.26	
	Наполнение сайта	3 дней	Пн 06.04.26	Ср 08.04.26	
	Тестирование сайта	5 дней	Пн 06.04.26	Пт 10.04.26	
	Сдача сайта заказчику	0 дней	Пн 06.04.26	Пн 06.04.26	

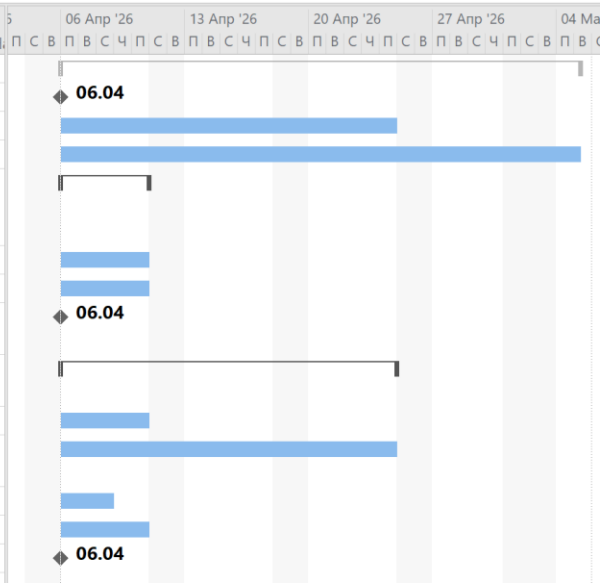

Задание 4: Установление связей между задачами

Режи задач	Название задачи	Длительнос	Начало	Окончание	Предшественни	Названия
	rk_1	**56 дней**	**Пн 06.04.26**	**Пт 26.06.26**		
	Начало проекта	0 дней	Пн 06.04.26	Пн 06.04.26		
	Установка ПО	15 дней	Вт 07.04.26	Пн 27.04.26	1ОН+1 день	
	Обучение персонала	20 дней	Вт 21.04.26	Чт 21.05.26	2НН+10 дней	
	Разработка представительских сайтов	**8 дней**	**Чт 21.05.26**	**Вт 02.06.26**	**3**	
	Разработка сайта 1	5 дней	Чт 21.05.26	Чт 28.05.26		
	Разработка сайта 2	5 дней	Вт 26.05.26	Вт 02.06.26	5ОН-2 дней	
	Представительские сайты созданы	0 дней	Вт 02.06.26	Вт 02.06.26	4	
	Разработка корпоратичного сайта	**25 дней**	**Чт 21.05.26**	**Пт 26.06.26**	**3**	
	Проектирование сайта	5 дней	Чт 21.05.26	Чт 28.05.26		
	Программирование сайта	15 дней	Чт 28.05.26	Пт 19.06.26	9	
	Наполнение сайта	3 дней	Вт 16.06.26	Пт 19.06.26	10ОН-3 дней	
	Тестирование сайта	5 дней	Пт 19.06.26	Пт 26.06.26	11	
	Сдача сайта заказчику	0 дней	Пт 26.06.26	Пт 26.06.26	12	

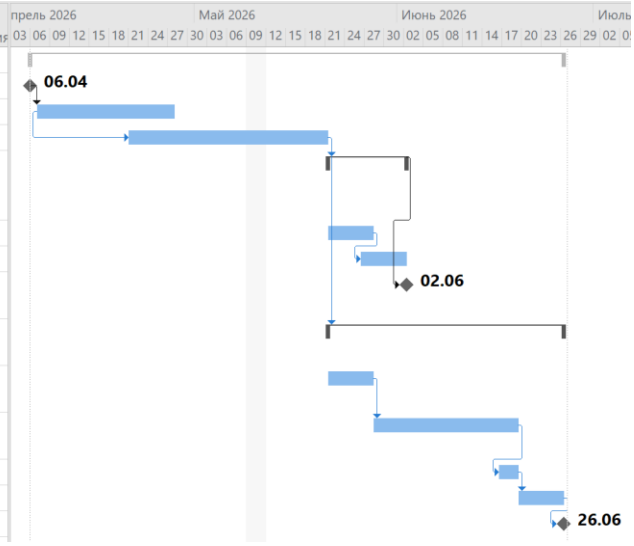

Задание 5: Создание списка ресурсов

Название ресурса	Тип	Единицы измерения материалов	Краткое название	Группа	Макс. единиц	Стандартная ставка	Ставка сверхурочны	Затраты на использ.	Начисление	Базовый календарь
Соколов	Трудовой		С	Программ	100%	70 000,00 ₽/мес	0,00 ₽/ч	0,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Соломин	Трудовой		С	Программ	100%	55 000,00 ₽/мес	0,00 ₽/ч	0,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Тимофеев	Трудовой		Т	Программ	100%	50 000,00 ₽/мес	0,00 ₽/ч	0,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Яковлева	Трудовой		Я	Программ	100%	50 000,00 ₽/мес	0,00 ₽/ч	0,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Петров	Трудовой		П	Дизайнер	100%	75 000,00 ₽/мес	0,00 ₽/ч	0,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Кузнецов	Трудовой		К	Дизайнер	100%	50 000,00 ₽/мес	0,00 ₽/ч	0,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Фомина	Трудовой		Ф	Редактор с	100%	40 000,00 ₽/мес	0,00 ₽/ч	0,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Преподаватели	Трудовой		П	Преподава	400%	700,00 ₽/день	0,00 ₽/ч	0,00 ₽	По окончании	Стандартный
Програмное обеспечение	Материальный		П	ПО		30 000,00 ₽		5 000,00 ₽	В начале	
Картриджи для принтера	Материальный		К	Расходные материалы		2 500,00 ₽		0,00 ₽	В начале	
Бумаша	Материальный	пач	Б	Расходные		200,00 ₽		0,00 ₽	Пропорциональн	

Установила в заметках, что Соколов ведущий программист:

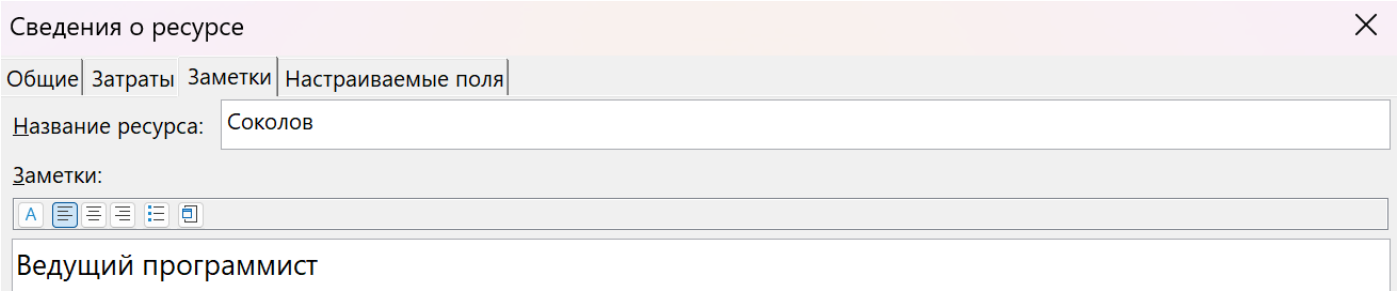

Установила в заметках, что Петров руководитель дизайнерской группы:

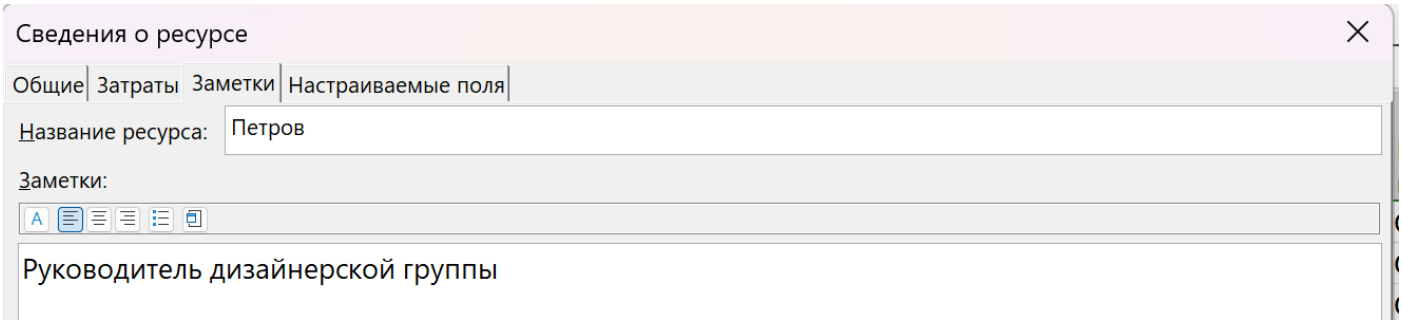

Задание 6: Назначение ресурсов задачам

Назначила ресурсы задачам и установила фиксированные затраты для 5, 6 и 10 задач:

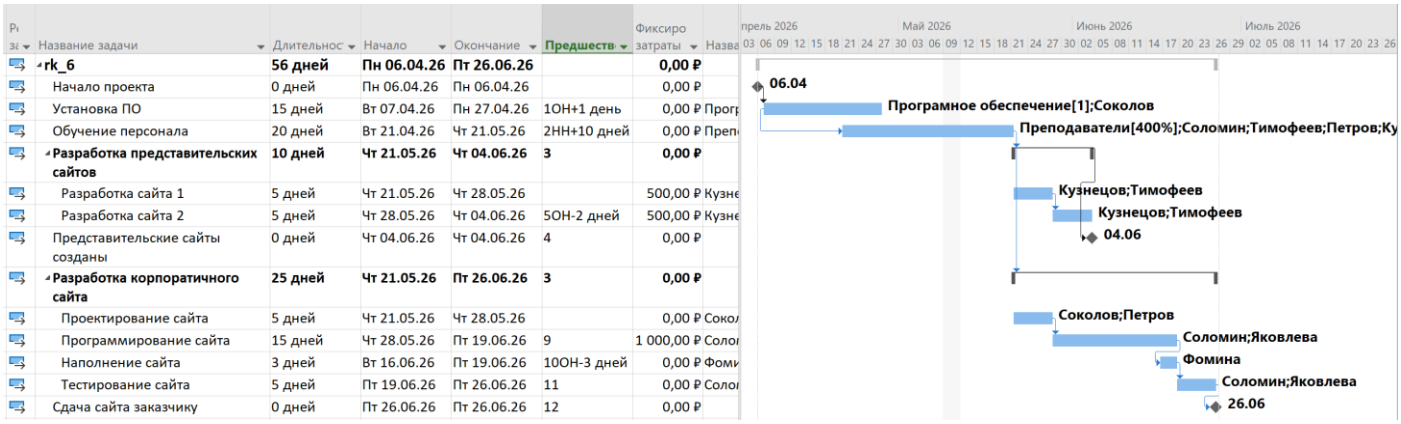

Название задачи	Длительнос	Начало	Окончание	Предшестви	Фиксиро затраты	Назва
rk_6	**56 дней**	**Пн 06.04.26**	**Пт 26.06.26**		**0,00 ₽**	
Начало проекта	0 дней	Пн 06.04.26	Пн 06.04.26		0,00 ₽	
Установка ПО	15 дней	Вт 07.04.26	Пн 27.04.26	1ОН+1 день	0,00 ₽	Прогр
Обучение персонала	20 дней	Вт 21.04.26	Чт 21.05.26	2НН+10 дней	0,00 ₽	Преп
Разработка представительских сайтов	**10 дней**	**Чт 21.05.26**	**Чт 04.06.26**	**3**	**0,00 ₽**	
Разработка сайта 1	5 дней	Чт 21.05.26	Чт 28.05.26		500,00 ₽	Кузне
Разработка сайта 2	5 дней	Чт 28.05.26	Чт 04.06.26	5ОН-2 дней	500,00 ₽	Кузне
Представительские сайты созданы	0 дней	Чт 04.06.26	Чт 04.06.26	4	0,00 ₽	
Разработка корпоратичного сайта	**25 дней**	**Чт 21.05.26**	**Пт 26.06.26**	**3**	**0,00 ₽**	
Проектирование сайта	5 дней	Чт 21.05.26	Чт 28.05.26		0,00 ₽	Сокол
Программирование сайта	15 дней	Чт 28.05.26	Пт 19.06.26	9	1 000,00 ₽	Солог
Наполнение сайта	3 дней	Вт 16.06.26	Пт 19.06.26	10ОН-3 дней	0,00 ₽	Фоми
Тестирование сайта	5 дней	Пт 19.06.26	Пт 26.06.26	11	0,00 ₽	Солог
Сдача сайта заказчику	0 дней	Пт 26.06.26	Пт 26.06.26	12	0,00 ₽	

Установил расход бумаги как 3 пачки в месяц:

Сведения о задаче

Общие | Предшественники | Ресурсы | Дополнительно | Заметки | Настраиваемые поля

Название: Обучение персонала

Длительность: 20 дней

Предв. оценка

Ресурсы:

Название ресурса	Владелец назначения	Единицы	Затраты
Преподаватели		400%	14 000,00 ₽
Соломин		100%	55 000,00 ₽
Тимофеев		100%	50 000,00 ₽
Петров		100%	75 000,00 ₽
Кузнецов		100%	50 000,00 ₽
Яковлева		100%	50 000,00 ₽
Бумага		3 пач/мес	200,00 ₽
Картриджи для принтера		1	2 500,00 ₽

Вывод

На данный момент проект укладывается и в срок и с бюджет

Статистика проекта для 'rk_6.mpp'

	Начало	Окончание
Текущее	Пн 06.04.26	Пт 26.06.26
Базовое	НД	НД
Фактическое	НД	НД
Отклонение	0д	0д

	Длительность	Трудозатраты	Затраты
Текущие	56д	1 664ч	583 450,00 ₽
Базовые	0д	0ч	0,00 ₽
Фактические	0д	0ч	0,00 ₽
Оставшиеся	56д	1 664ч	583 450,00 ₽

Процент завершения

Длительность: 0% Трудозатраты: 0%

Закрыть

Задание 7: оптимизация загрузки ресурсов. Разбиение задач на подзадачи

Перед разбиением на подзадачи удалила все связи и сняла ранее назначенные ресурсы.

Добавила подзадачи и назначила на них ресурсы:

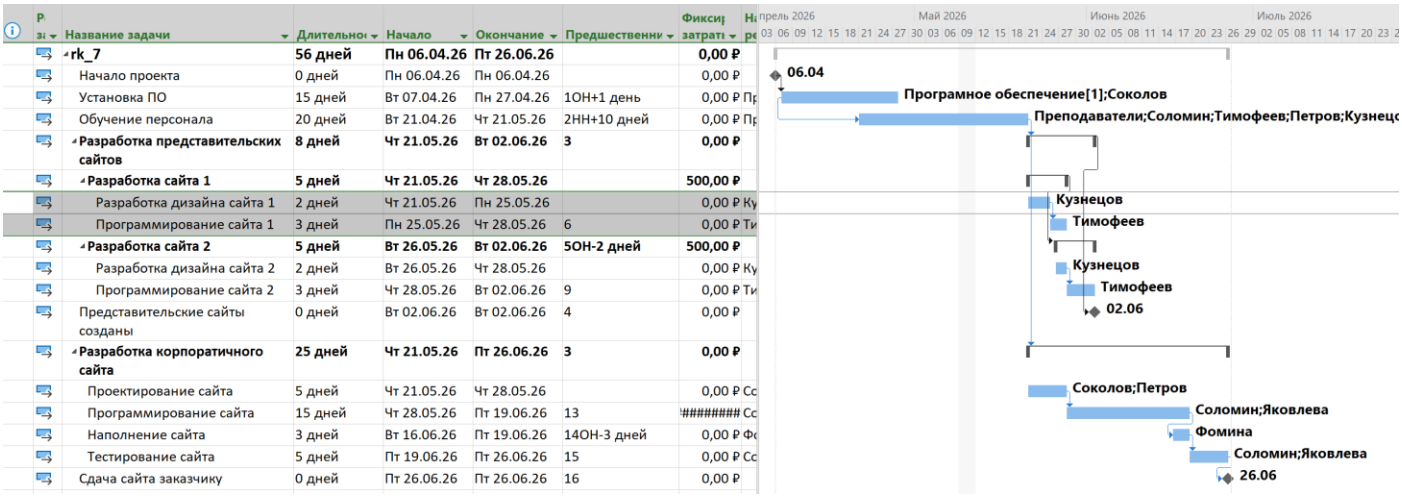

Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Предшественники	Фиксированные затраты
rk_7	**56 дней**	**Пн 06.04.26**	**Пт 26.06.26**		**0,00 ₽**
Начало проекта	0 дней	Пн 06.04.26	Пн 06.04.26		0,00 ₽
Установка ПО	15 дней	Вт 07.04.26	Пн 27.04.26	1ОН+1 день	0,00 ₽
Обучение персонала	20 дней	Вт 21.04.26	Чт 21.05.26	2НН+10 дней	0,00 ₽
Разработка представительских сайтов	**8 дней**	**Чт 21.05.26**	**Вт 02.06.26**	**3**	**0,00 ₽**
Разработка сайта 1	**5 дней**	**Чт 21.05.26**	**Чт 28.05.26**		**500,00 ₽**
Разработка дизайна сайта 1	2 дней	Чт 21.05.26	Пн 25.05.26		0,00 ₽
Программирование сайта 1	3 дней	Пн 25.05.26	Чт 28.05.26	6	0,00 ₽
Разработка сайта 2	**5 дней**	**Вт 26.05.26**	**Вт 02.06.26**	**5ОН-2 дней**	**500,00 ₽**
Разработка дизайна сайта 2	2 дней	Вт 26.05.26	Чт 28.05.26		0,00 ₽
Программирование сайта 2	3 дней	Чт 28.05.26	Вт 02.06.26	9	0,00 ₽
Представительские сайты созданы	0 дней	Вт 02.06.26	Вт 02.06.26	4	0,00 ₽
Разработка корпоратичного сайта	**25 дней**	**Чт 21.05.26**	**Пт 26.06.26**	**3**	**0,00 ₽**
Проектирование сайта	5 дней	Чт 21.05.26	Чт 28.05.26		0,00 ₽
Программирование сайта	15 дней	Чт 28.05.26	Пт 19.06.26	13	########
Наполнение сайта	3 дней	Вт 16.06.26	Пт 19.06.26	14ОН-3 дней	0,00 ₽
Тестирование сайта	5 дней	Пт 19.06.26	Пт 26.06.26	15	0,00 ₽
Сдача сайта заказчику	0 дней	Пт 26.06.26	Пт 26.06.26	16	0,00 ₽

Вывод

После внесенных изменений срок сдачи проекта не сдвинулся, но уменьшился бюджет на 25 тыс рублей. Ускорение произошло со счет того что в сумме задачи по разработке сайта 1 и 2 стали занимать меньше времени на 2 дня.

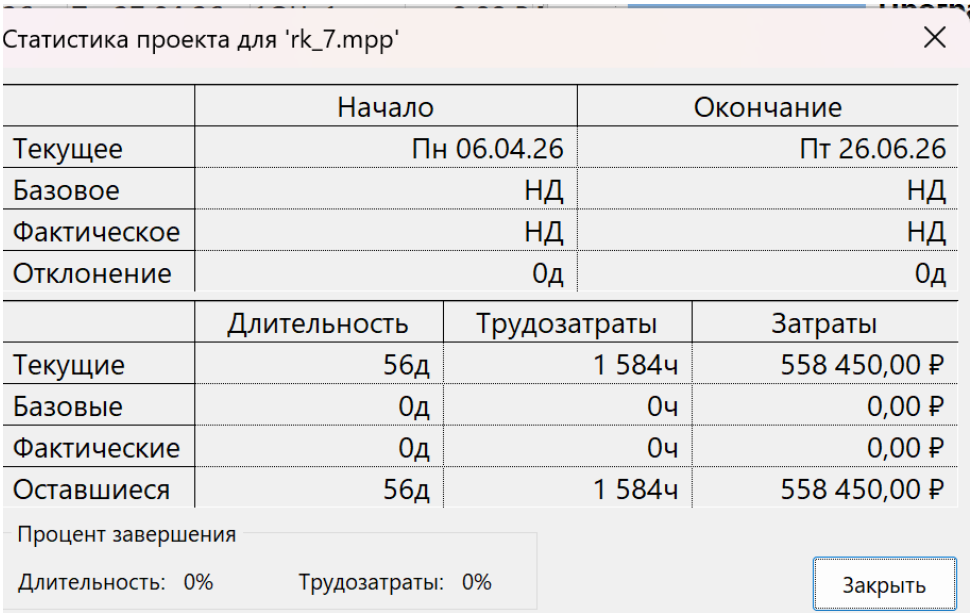

Статистика проекта для 'rk_7.mpp'

	Начало	Окончание
Текущее	Пн 06.04.26	Пт 26.06.26
Базовое	НД	НД
Фактическое	НД	НД
Отклонение	0д	0д

	Длительность	Трудозатраты	Затраты
Текущие	56д	1 584ч	558 450,00 ₽
Базовые	0д	0ч	0,00 ₽
Фактические	0д	0ч	0,00 ₽
Оставшиеся	56д	1 584ч	558 450,00 ₽

Процент завершения

Длительность: 0% Трудозатраты: 0%

Закрыть

Задание 8: Переназначение ресурсов

Назначила ресурс Соколов на задачу “Обучение персонала” и сократила количество единиц ресурса Преподаватели до 300%:

Назначение ресурсов

Задача: Обучение персонала

+ Параметры списка ресурсов

Ресурсы из проекта 'rk_8_2.mpp'

	Название ресурса	З/П	Единиць	Затраты
✓	Бумага		3 пач/ме	171,43 ₽
✓	Картриджи для принтера		1	2 500,00 ₽
✓	Кузнецов		100%	42 857,14 ₽
✓	Петров		100%	64 285,71 ₽
✓	Преподаватели		300%	12 000,00 ₽
✓	Соколов		100%	60 000,00 ₽
✓	Соломин		100%	47 142,86 ₽
✓	Тимофеев		100%	42 857,14 ₽
✓	Яковлева		100%	42 857,14 ₽
	Програмное обеспечение			

Назначить

Удалить

Заменить...

График

Закрыть

Справка

По итогу окончание проекта сдвинулось на 4 вперед и затраты увеличились на 18 тысяч. Так как Сокоров назначен на параллельно идущую задачу “Установка ПО”

Статистика проекта для 'rk_8.mpp'

	Начало	Окончание
Текущее	Пн 06.04.26	Вт 30.06.26
Базовое	НД	НД
Фактическое	НД	НД
Отклонение	0д	0д

	Длительность	Трудозатраты	Затраты
Текущие	58,14д	1 584ч	576 421,43 ₽
Базовые	0д	0ч	0,00 ₽
Фактические	0д	0ч	0,00 ₽
Оставшиеся	58,14д	1 584ч	576 421,43 ₽

Процент завершения

Длительность: 0% Трудозатраты: 0%

Закрыть

В целях оптимизации были выставлены профили у Соколова. “Установка По” – загрузка в начале, “Обучение персонала” – загрузка в конце.

Сведения о назначении

Общие | Отслеживание | Заметки

Задача:	Установка ПО		
Ресурс:	Соколов		
Трудозатраты:	120ч	Единицы:	100%
Профиль загрузки:	Загрузка в начале		
Начало:	Вт 07.04.26	Тип резервиров.:	Выделенный
Окончание:	Пн 27.04.26	Затраты:	52 500,00 ₽
Таблица норм затрат:	А	Владелец назначения:	

Сведения о назначении

Общие | Отслеживание | Заметки

Задача:	Обучение персонала		
Ресурс:	Соколов		
Трудозатраты:	137,14ч	Единицы:	100%
Профиль загрузки:	Загрузка в конце		
Начало:	Чт 30.04.26	Тип резервиров.:	Выделенный
Окончание:	Пт 05.06.26	Затраты:	60 000,00 ₽
Таблица норм затрат:	А	Владелец назначения:	

	Режим задачи	Название задачи	Трудозатрать	Длительнос
		rk_8_3	**1 584 ч**	**66,07 дней**
		Начало проекта	0 ч	0 дней
		Установка ПО	120 ч	25 дней
		Соколов	*120 ч*	
		Програмное обеспеч	*1*	
		Обучение персонала	960 ч	30,07 дней
		Соколов	*137,14 ч*	
		Соломин	*137,14 ч*	
		Тимофеев	*137,14 ч*	
		Яковлева	*137,14 ч*	
		Петров	*137,14 ч*	
		Кузнецов	*137,14 ч*	
		Преподаватели	*137,14 ч*	
		Картриджи для при	*1*	
		Бумага	*0,86 пач*	

В результате длительность проекта увеличилась на 10 дней

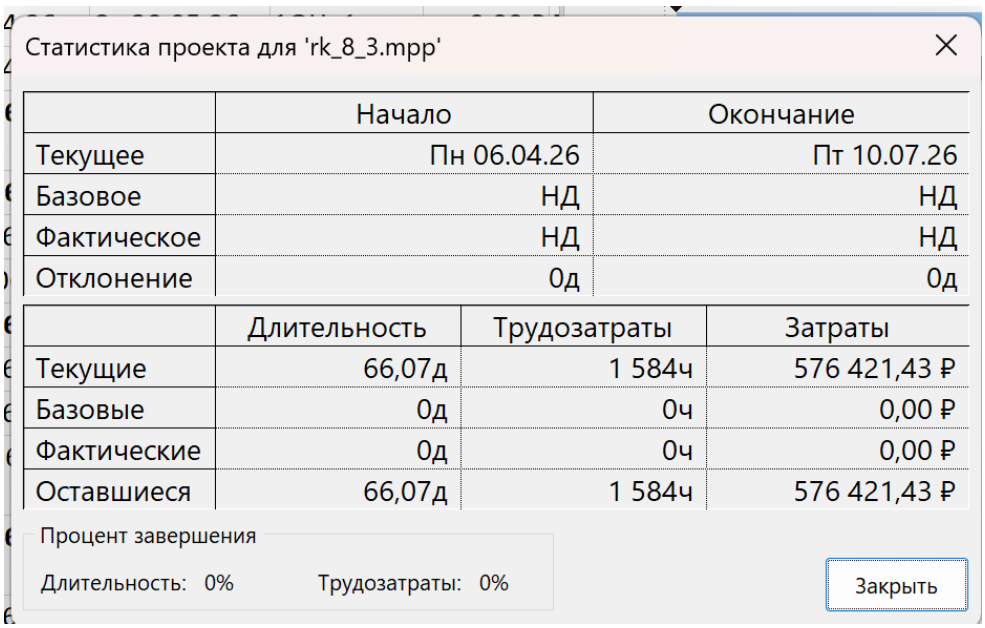

Статистика проекта для 'rk_8_3.mpp'

	Начало	Окончание
Текущее	Пн 06.04.26	Пт 10.07.26
Базовое	НД	НД
Фактическое	НД	НД
Отклонение	0д	0д

	Длительность	Трудозатраты	Затраты
Текущие	66,07д	1 584ч	576 421,43 ₽
Базовые	0д	0ч	0,00 ₽
Фактические	0д	0ч	0,00 ₽
Оставшиеся	66,07д	1 584ч	576 421,43 ₽

Процент завершения

Длительность: 0% Трудозатраты: 0%

Закрыть

Вывод

Назначение Соколова на задачу “Обучение персонала” увеличивает сроки проекта и требуемый бюджет – не выгодно.

Задание 9: Уточнение плана проекта

Данное задание выполнялось на основе задания 7, т к добавление Соколова на задачу “Обучение персонала” не выгодно.

Критические задачи:

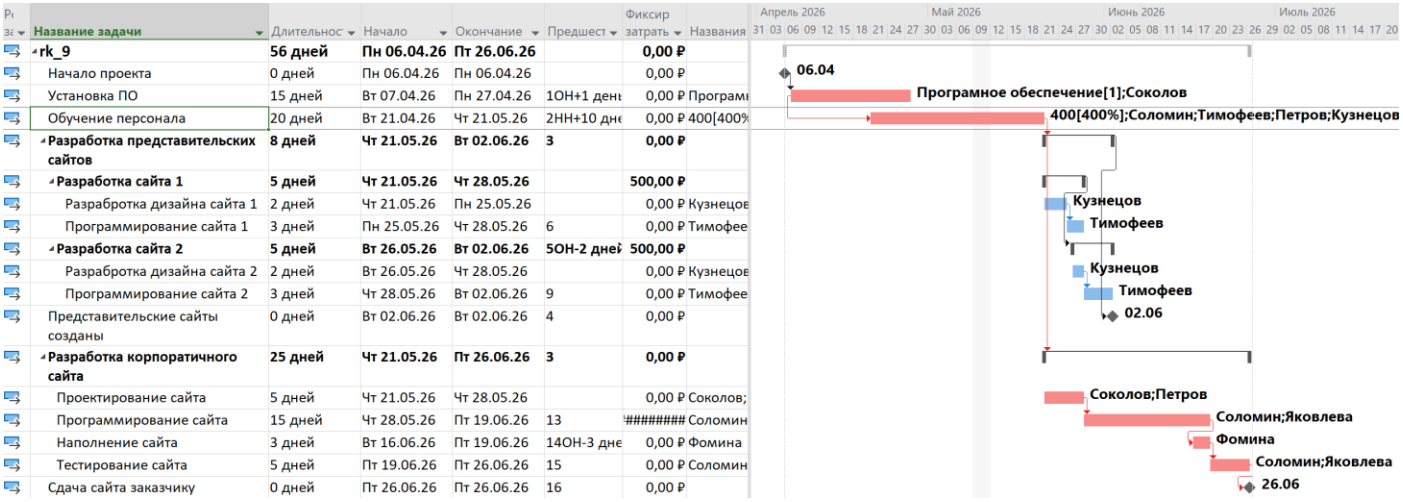

Название задачи	Длительнос	Начало	Окончание	Предшест	Фиксир затрать	Названия
rk_9	**56 дней**	**Пн 06.04.26**	**Пт 26.06.26**		**0,00 ₽**	
Начало проекта	0 дней	Пн 06.04.26	Пн 06.04.26		0,00 ₽	
Установка ПО	15 дней	Вт 07.04.26	Пн 27.04.26	1ОН+1 дне	0,00 ₽	Програм
Обучение персонала	20 дней	Вт 21.04.26	Чт 21.05.26	2НН+10 дне	0,00 ₽	400[400%
Разработка представительских сайтов	**8 дней**	**Чт 21.05.26**	**Вт 02.06.26**	**3**	**0,00 ₽**	
Разработка сайта 1	**5 дней**	**Чт 21.05.26**	**Чт 28.05.26**		**500,00 ₽**	
Разработка дизайна сайта 1	2 дней	Чт 21.05.26	Пн 25.05.26		0,00 ₽	Кузнецов
Программирование сайта 1	3 дней	Пн 25.05.26	Чт 28.05.26	6	0,00 ₽	Тимофее
Разработка сайта 2	**5 дней**	**Вт 26.05.26**	**Вт 02.06.26**	**5ОН-2 дней**	**500,00 ₽**	
Разработка дизайна сайта 2	2 дней	Вт 26.05.26	Чт 28.05.26		0,00 ₽	Кузнецов
Программирование сайта 2	3 дней	Чт 28.05.26	Вт 02.06.26	9	0,00 ₽	Тимофее
Представительские сайты созданы	0 дней	Вт 02.06.26	Вт 02.06.26	4	0,00 ₽	
Разработка корпоратичного сайта	**25 дней**	**Чт 21.05.26**	**Пт 26.06.26**	**3**	**0,00 ₽**	
Проектирование сайта	5 дней	Чт 21.05.26	Чт 28.05.26		0,00 ₽	Соколов;
Программирование сайта	15 дней	Чт 28.05.26	Пт 19.06.26	13	########	Соломин
Наполнение сайта	3 дней	Вт 16.06.26	Пт 19.06.26	14ОН-3 дне	0,00 ₽	Фомина
Тестирование сайта	5 дней	Пт 19.06.26	Пт 26.06.26	15	0,00 ₽	Соломин
Сдача сайта заказчику	0 дней	Пт 26.06.26	Пт 26.06.26	16	0,00 ₽	

Статистика до изменений

Статистика проекта для 'rk_9.mpp'

	Начало	Окончание
Текущее	Пн 06.04.26	Пт 26.06.26
Базовое	НД	НД
Фактическое	НД	НД
Отклонение	0д	0д

	Длительность	Трудозатраты	Затраты
Текущие	56д	1 584ч	558 404,84 ₽
Базовые	0д	0ч	0,00 ₽
Фактические	0д	0ч	0,00 ₽
Оставшиеся	56д	1 584ч	558 404,84 ₽

На задачу программирование сайта был добавлен Тимофеев, по счет чего было сэкономлено 1250 рубей, и 7 дней

Статистика проекта для 'rk_9.mpp'

	Начало	Окончание
Текущее	Пн 06.04.26	Пт 19.06.26
Базовое	НД	НД
Фактическое	НД	НД
Отклонение	0д	0д

	Длительность	Трудозатраты	Затраты
Текущие	51д	1 584ч	557 154,84 ₽
Базовые	0д	0ч	0,00 ₽
Фактические	0д	0ч	0,00 ₽
Оставшиеся	51д	1 584ч	557 154,84 ₽

Процент завершения

Длительность: 0% Трудозатраты: 0%

Закрыть

Задание 10: Контроль за реализацией проекта

Дата отчета: 25.05.2026

“Обучение персонала” фактически длилось 25 дней

“Разработка дизайна сайта” фактически началась 28 мая

Р. за	Название задачи	Длительно	Начало	Окончание	Предшес	Фиксиро затраты	Назван ресурс
	rk_10	**51 дней**	**Пн 06.04.26**	**Пт 19.06.26**		**0,00 ₽**	
	Начало проекта	0 дней	Пн 06.04.26	Пн 06.04.26		0,00 ₽	
	Установка ПО	15 дней	Вт 07.04.26	Пн 27.04.26	1ОН+1 день	0,00 ₽	Програ
	Обучение персонала	20 дней	Вт 21.04.26	Чт 21.05.26	2НН+10 дне	0,00 ₽	400[40
	Разработка представительских сайтов	**18 дней**	**Чт 21.05.26**	**Ср 17.06.26**	**3**	**0,00 ₽**	
	Разработка сайта 1	**5 дней**	**Чт 21.05.26**	**Чт 28.05.26**		**500,00 ₽**	
	Разработка дизайна сайта 1	2 дней	Чт 21.05.26	Пн 25.05.26		0,00 ₽	Кузнец
	Программирование сайта 1	3 дней	Пн 25.05.26	Чт 28.05.26	6	0,00 ₽	Тимоф
	Разработка сайта 2	**15 дней**	**Вт 26.05.26**	**Ср 17.06.26**	**5ОН-2 дней**	**500,00 ₽**	
	Разработка дизайна сайта 2	2 дней	Вт 26.05.26	Чт 28.05.26		0,00 ₽	Кузнец
	Программирование сайта 2	3 дней	Чт 11.06.26	Ср 17.06.26	9	0,00 ₽	Тимоф
	Представительские сайты созданы	0 дней	Ср 17.06.26	Ср 17.06.26	4	0,00 ₽	
	Разработка корпоратичного сайта	**20 дней**	**Чт 21.05.26**	**Пт 19.06.26**	**3**	**0,00 ₽**	
	Проектирование сайта	5 дней	Чт 21.05.26	Чт 28.05.26		0,00 ₽	Соколо
	Программирование сайта	10 дней	Чт 28.05.26	Чт 11.06.26	13	1 000,00 ₽	Соломи
	Наполнение сайта	3 дней	Пн 08.06.26	Чт 11.06.26	14ОН-3 дне	0,00 ₽	Фомин
	Тестирование сайта	5 дней	Чт 11.06.26	Пт 19.06.26	15	0,00 ₽	Соломи
	Сдача сайта заказчику	0 дней	Пт 19.06.26	Пт 19.06.26	16	0,00 ₽	

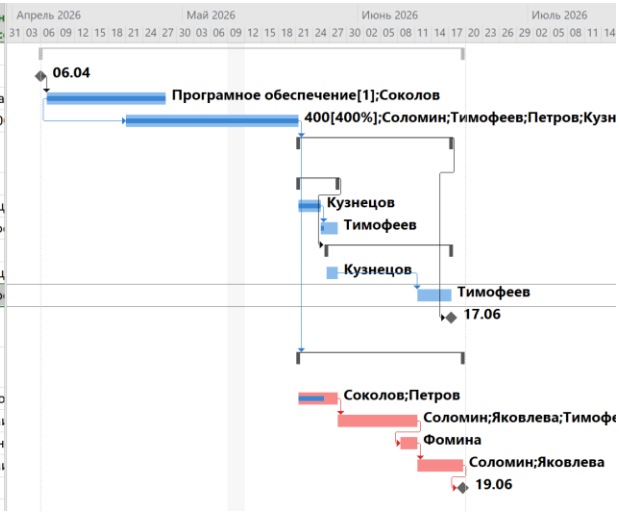

Отклонение по длительности составило 4 дня, а по стоимости 72 500 рублей

Отклонение длительности	Отклонение по стоимости
4 дней	**72 500,00 ₽**
0 дней	0,00 ₽
0 дней	0,00 ₽
5 дней	72 500,00 ₽
2 дней	**0,00 ₽**
2 дней	**0,00 ₽**
0 дней	0,00 ₽
0 дней	0,00 ₽
0 дней	**0,00 ₽**
0 дней	0,00 ₽
0 дней	0,00 ₽
0 дней	0,00 ₽
4 дней	**0,00 ₽**
0 дней	0,00 ₽
1,75 дней	0,00 ₽
0 дней	0,00 ₽
0 дней	0,00 ₽
0 дней	0,00 ₽

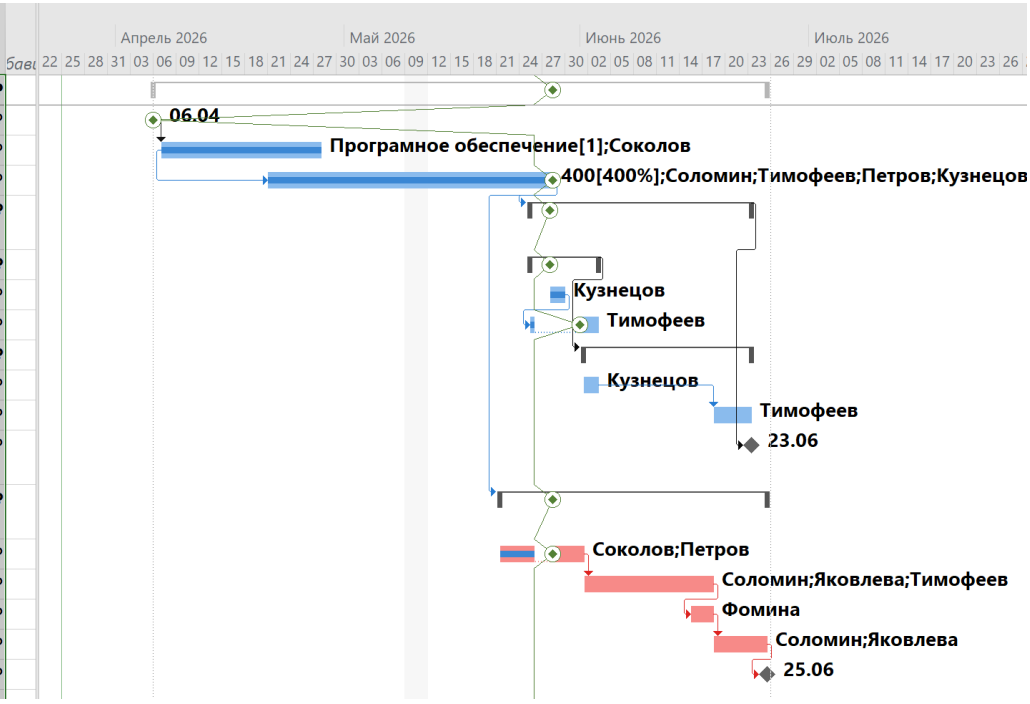

На дату создания отчета освоенный объём (ОО) составил 406 042 руб, что меньше запланированного объема (ЗО) – 441 242 руб.

Отклонение от календарного плана (ОКП) составило -5 200 руб, это значит, что работали больше (проект выполняется с отставанием).

Отклонение по стоимости (ОПС) -40 925 руб, проект не укладывается в смету.

Предварительная оценка по завершении (ПОПЗ) 613 310 руб.

Вывод

Статистика проекта для 'rk_10.mpp'

	Начало	Окончание
Текущее	Пн 06.04.26	Чт 25.06.26
Базовое	Пн 06.04.26	Пт 19.06.26
Фактическое	Пн 06.04.26	НД
Отклонение	0д	4д

	Длительность	Трудозатраты	Затраты
Текущие	55д	1 784ч	629 654,84 ₽
Базовые	51д	1 584ч	557 154,84 ₽
Фактические	33,48д	1 346ч	483 742,34 ₽
Оставшиеся	21,52д	438ч	145 912,50 ₽

По базовому плану проект относительно изначально заданных параметров (3 месяца и 675 тыс руб) проект укладывается по срокам и бюджету.

Однако относительного заданного плата проект не укладывается в смету и выполняется с отставанием.
